1. sz. melléklet

#	tevékenység	kezdés	befejezés
1	Tervezési szakasz	2008.11.03.	2009.05.11.
2	Tender terveket készítő szakértő kiválasztására, dokumentáció összeállítása	2008.11.03.	2008.12.08.
3	KSZ véleményezése	2008.12.08.	2009.01.07.
4	észrevételek átvezetése	2009.01.08.	2009.01.30.
5	KSZ jóváhagyás	2009.02.02.	2009.02.27.
6	közbeszerzési eljárás	2009.03.02.	2009.03.31.
7	szerződéskötés	2009.04.01.	2009.04.14.
8	Tenderkiíráshoz szükséges tervek elkészítése	2009.04.15.	2009.06.15.
9	RMT készítési szakasz	2008.11.14.	2009.07.15.
10	RMT tervezet elkészítése	2008.11.14.	2009.02.02.
11	KSZ véleményezése	2009.02.02.	2009.02.27.
12	észrevételek átvezetése	2009.03.02.	2009.03.13.
13	KSZ jóváhagyás	2009.03.16.	2009.04.14.
14	Pályázati dokumentáció összeállítása RMT	2009.06.15.	2009.07.14.
15	Terület előkészítés	2009.04.15.	2009.05.29.
16	régészeti felmérés	2009.04.15.	2009.05.29.
17	lőszermentesítés	2009.04.15.	2009.05.29.
18	FIDIC I.-II. kötet	2009.04.15.	2009.07.14.
19	Kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési dokumentáció elkészítése (kivitelezés, mérnök)	2009.04.15.	2009.05.14.
20	KSZ véleményezése	2009.05.15.	2009.06.15.
21	észrevételek átvezetése	2009.06.15.	2009.06.29.
22	KSZ jóváhagyás	2009.06.30.	2009.07.15.
23	Projekt zárás	2009.07.01.	2009.09.29.
24	A projekt pénzügyi teljesítése, végső kifizetések	2009.07.01.	2009.08.31.
25	Zárójelentés	2009.09.01.	2009.09.30.

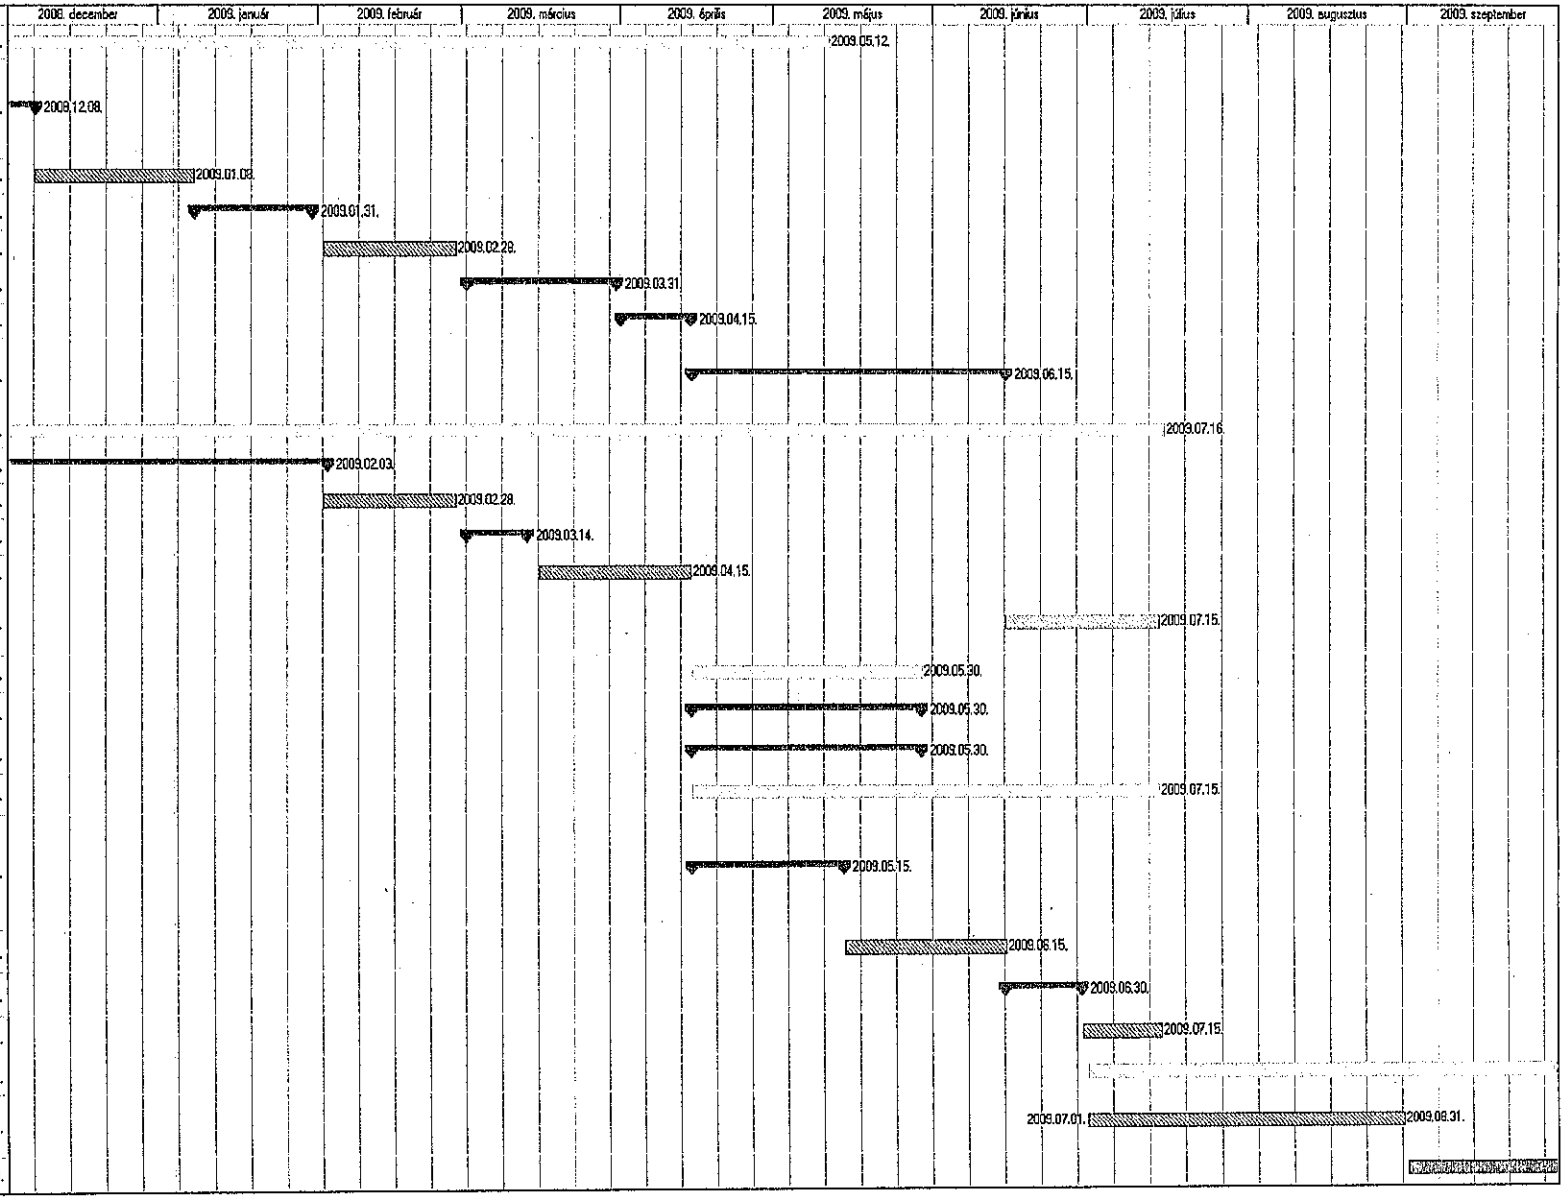

2. sz. melléklet
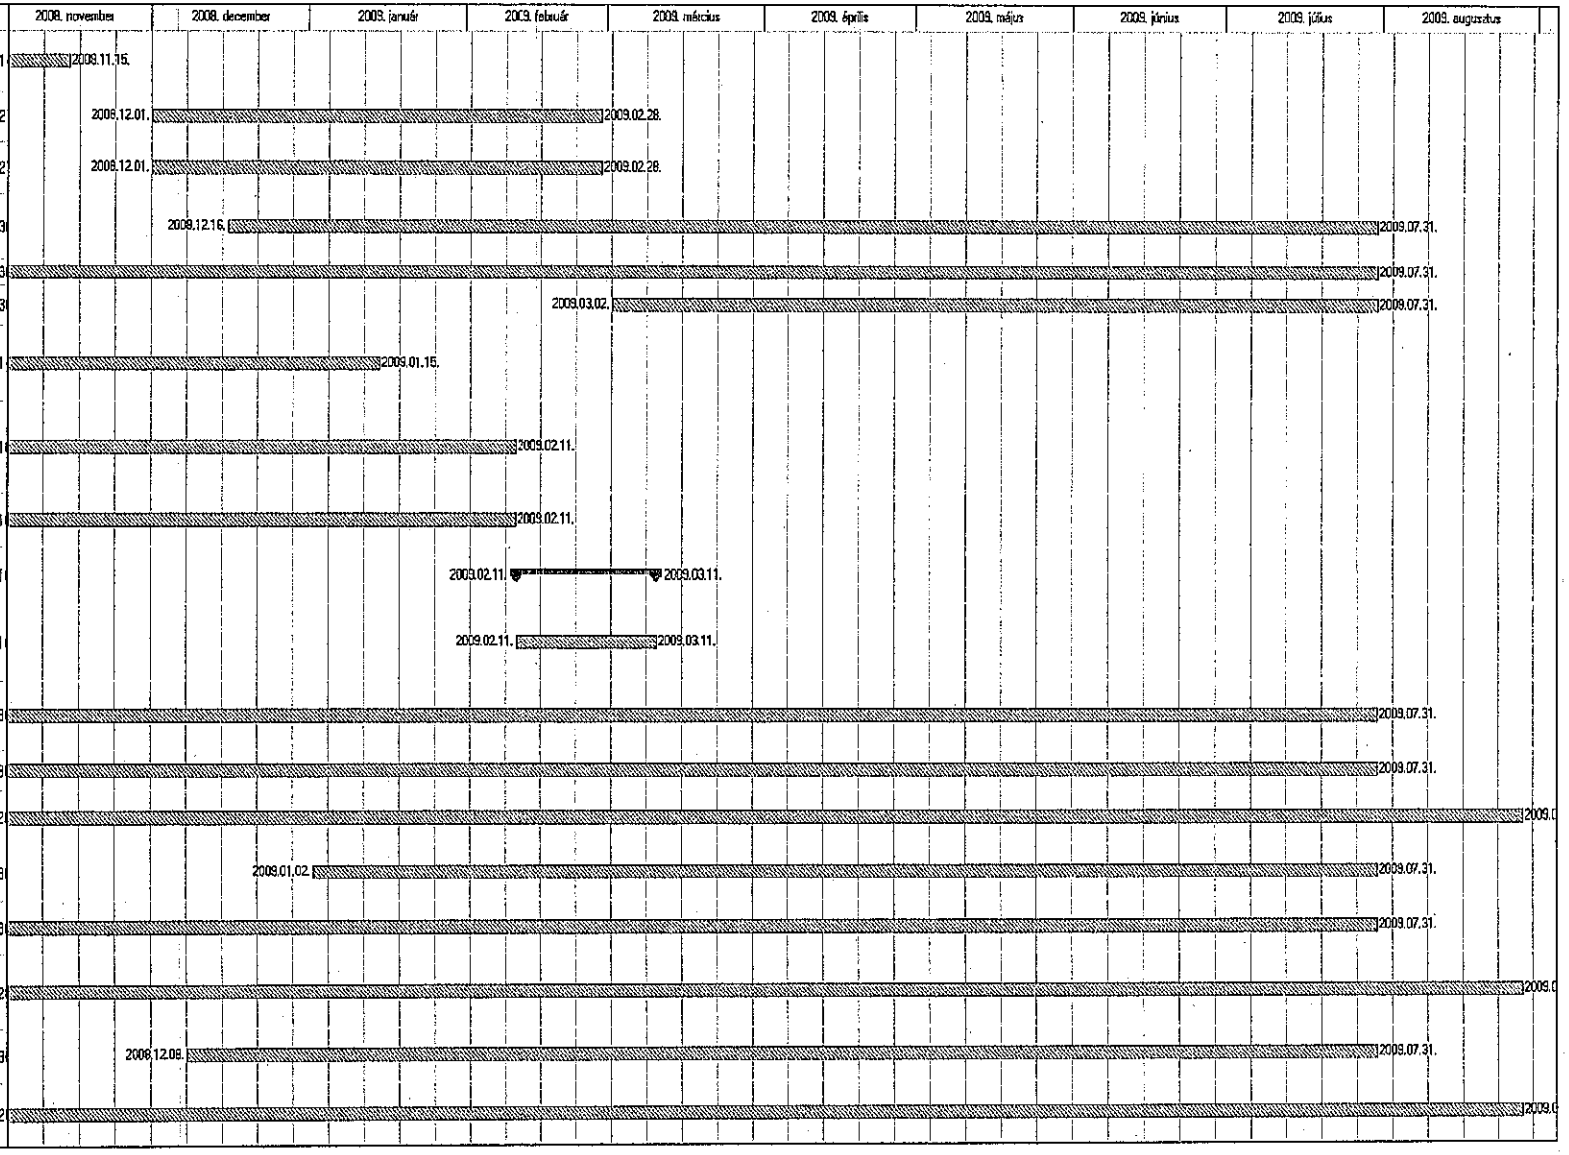
#	Dévaványa PR menetrend	Kezdés	Vége
1	Lehetséges kockázatok felmérése	008.11.03.	008.11.1
2	Válságkommunikációs terv készítése	008.12.01.	009.02.2
3	Vélemény-vezérek azonosítása	008.12.01.	009.02.2
4	Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	009.12.16.	009.07.3
5	Közvélemény kutatás	008.11.03.	009.07.3
6	Hatástanulmány készítése	009.03.02.	009.07.3
7	Korábbi média megjelenések összegyűjtése és elemzése	008.11.03.	009.01.1
8	A projekt menet-rendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjának összegyűjtése	008.11.03.	009.02.1
9	Cselekvési (kommunikációs) terv kidolgozása	008.11.03.	009.02.1
10	A kommunikációs terv egyeztetése a közre-működő szervezettel	009.02.11.	009.03.1
11	A beruházó képvise-lőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	009.02.11.	009.03.1
12	Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	008.11.03.	009.07.3
13	Sajtóesemények szervezése	008.11.03.	009.07.3
14	Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	008.11.03.	009.08.2
15	Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	009.01.02.	009.07.3
16	Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése	008.11.03.	009.07.3
17	Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	008.11.03.	009.08.2
18	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	008.12.08.	009.07.3
19	Önkormányzatnál elhe-lyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók	008.11.03.	009.08.2
